

BAGA BDT - horisontell markbädd - BDT 1-6 hh

Allmänna uppgifter

Fastighetsbeteckning:			
Kommun:			
Uppgifter ifyllda av:	☐ Entreprenör ☐ Fastighetsägare ☐ Konsult ☐ Annan	Datum:	
Kontaktperson:			
Ev. firmanamn:			
Telefon:			
Email:			


Anläggningens storlek

Alt.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Egen dimensionering:	☐
Antal hushåll:	1	2	3	4	5	6		
Antal PE:	5	10	15	20	25	30		
Flöde m ³ /dygn:	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6		
Våtvoly m ³ :	1,2	2,2	3,0	3,0	4,0	7,0		
Slamvoly m ³ :	0,5	1,0	2,0	2,0	3,0	4,0		
Antal bioModulpaket:	1	2	3	3	4	5		
Bäddyta:	16,5	33	49,5	49,5	66	82,5		
Längd m:	5,5	11	8,25	8,25	11	13,75		
Bredd m:	3	3	6	6	6	6		


Anläggningsinformation

Mätning / Uppgift	Värde / Svar
Test av markens genomsläpplighet utfört genom:	LTAR =
☐ Perkolationstest i rör ☐ Perkolationstest i grop ☐ Siktanalys ☐ Okulärbesiktning	
Provtagningsbrunn	☐ Ja ☐ Nej
Tätskikt (gummiduk)	☐ Ja ☐ Nej
Avskärande dränering	☐ Ja ☐ Nej (behövs ej)
Ventilation av slamavskiljaren möjlig enligt anvisning	☐ Över taknock ☐ Annan
Beskickning av bädd	☐ Pump ☐ Självfall
Anläggningen utförs enligt BAGAs dokumenterade anvisningar	☐ Ja ☐ Nej (Se övrig info.)
Övrig information:	



Bäddens uppbyggnad

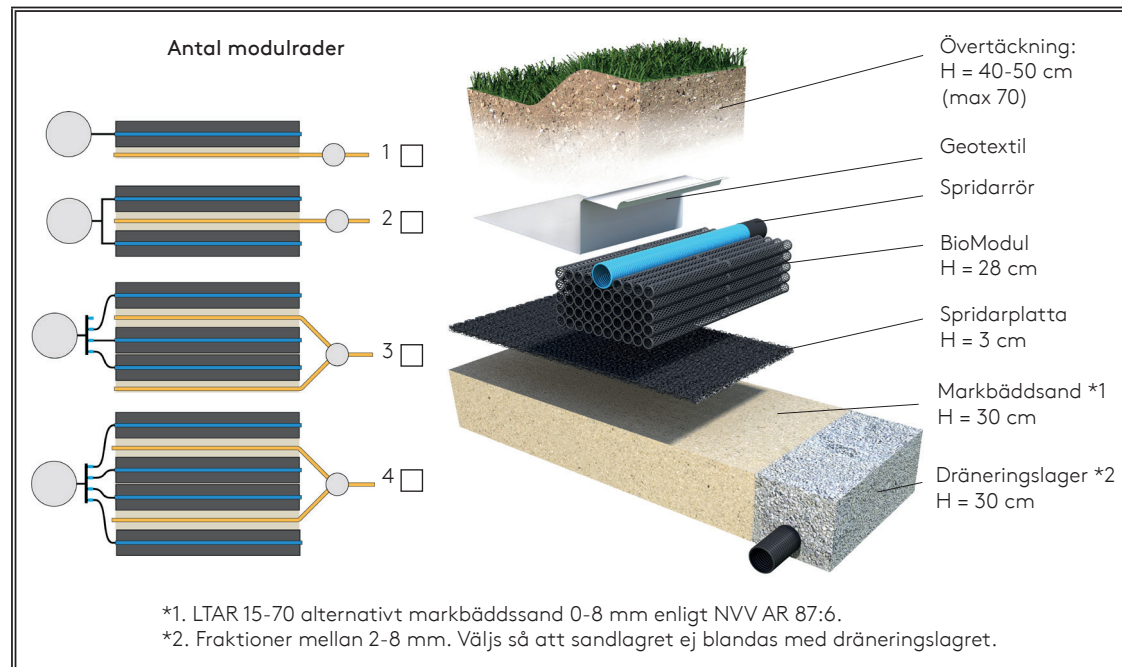

Anläggningsens mått (Se vidare nästa sida)

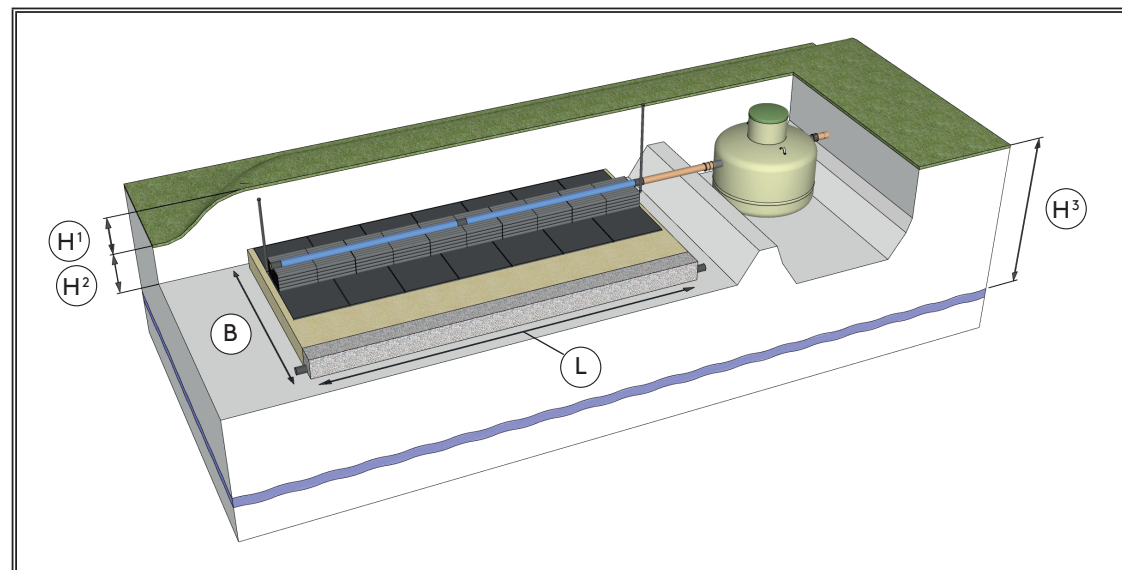

BAGA BDT - horisontell markbädd - BDT 1-6 hh

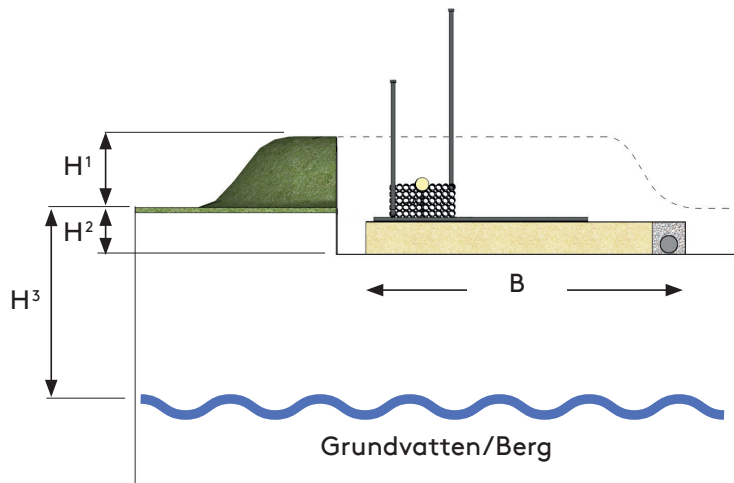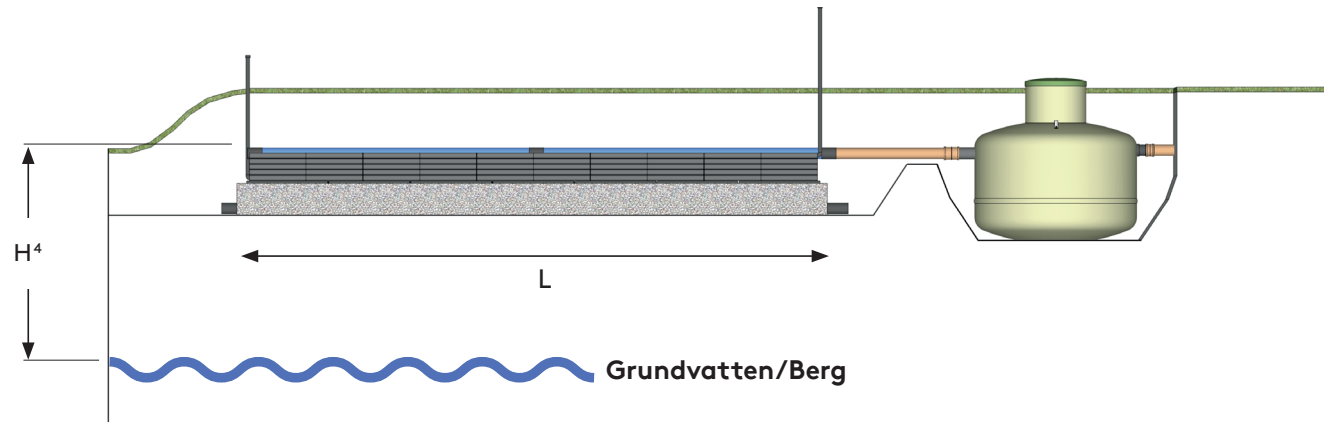


Grundvatten ☐ Berg ☐

Grundvattennivå kontrollerad med: Provgrop ☐ Grundvattenrör ☐ Annan metod:

Grundvattennivå uppmätt till: >2,5 m ☐ Annat värde:

Mått	Värde
L = Bäddens totala längd	
B = Bäddens totala bredd	
H ¹ = Höjd över befintlig markyta:	
H ² = Avstånd från befintlig markyta till bäddens schaktbotten:	
H ³ = Avstånd från befintlig markyta till beräknad högsta grundvattennivå eller berg:	
H ⁴ = Avstånd från spridarrörets underkant (infiltrationsytan) till beräknad högsta grundvattennivå.	

Avskärande dike

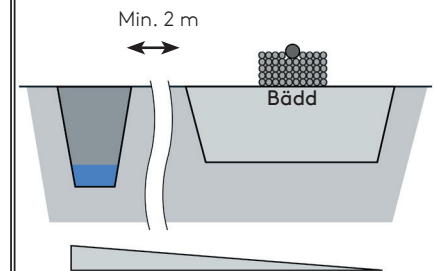

Kingspan BAGA

Torskorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona
T: 0455-61 61 50 | E: info@baga.se
www.kingspan.se/baga
